



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ.....	ท.๑๕
รับวันที่.....	๒๕ พ.ค. ๖๕
เวลา.....	๑๑.๕๐ น.

419

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๘๓

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดดินสอ - ดอนยุง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุ คำนวณราคากลาง ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

อนึ่ง ถนนสายนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังได้ทำการซ่อมแซม ตามโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ค่าจ้างตามสัญญา ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มรับประกันความชำรุดบกพร่องตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นการรับประกันความชำรุดบกพร่องวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๑ ปี คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรชะลอโครงการ ถนน คสล.ไว้ก่อนโดยกันเงินงบประมาณไว้ตามระเบียบฯ ดำเนินการหลังจากการประกันความชำรุดบกพร่องของสัญญาเดิมสิ้นสุดลง เพราะเมื่อเข้าไปทำถนน คสล.ทับลงไปจะทำให้การประกันความชำรุดบกพร่องเดิมสิ้นผลไป ทำให้ผู้รับจ้างตามสัญญาซ่อมแซมไม่ต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานซ่อมแซมที่ประกันไว้ เห็นว่าน่าจะไม่ต้องและคุ้มเสี่ยงที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาซ่อมแซม จึงควรชะลอโครงการ ถนน คสล.ไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายเสกสรรค์พิศชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ប្រាំ ២.០.០៧ (២)

๖.๑.๑๗ (๒)
 - เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการทุจริต
 ในคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี
 และหน่วยงานราชการอื่น ๆ
 ๖.๑.๑๘ (๓)
 - เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการทุจริต
 ในคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี
 และหน่วยงานราชการอื่น ๆ
 ๖.๑.๑๙ (๔)
 - เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการทุจริต
 ในคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี
 และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ความเห็นปลัดฯ

[illegible]

Chad

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

प्रकारित प्रसिद्धि
लोक सार्वजनिक
प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि

- ดนตรี / รวบรวม
สื่อการสอน / 1/1/68
1/1/68 / 1/1/68
1/1/68 / 1/1/68
จัดทำโดย ผอ. กองช่าง

(นายไชยเพชร พลสวัสดิ์)

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรตสินสอ - ดอนยุง หมู่ที่ ๖
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายปรีชา จินดานุ	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดิ์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี-
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรตสินสอ -
ดอนยุง หมู่ที่ ๖

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๘

แต่งตั้ง.... /

จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร
ดินสอ - ดอนยุง หมู่ที่ ๖ ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรดินสอ - ดอนยุง หมู่ที่ ๖
มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าชุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อย
กว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐
ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตาม
กำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้น
โครงการ กม.๐๐+ ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่
ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น
วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ
เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นค
๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวัน
ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ

ก่อสร้าง..../

ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุ ก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับ ส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดใน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่ง ธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หิน และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่ง ผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่ง อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

ตอนนี้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการแต่งตั้งบุคคลรายเดิม ๆ เหมือนที่ผ่านๆมาทุกโครงการ ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตั้ง ผอ.กองช่างเป็นประธาน นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ นายช่างโยธาเป็นผู้ควบคุมงานทุกโครงการจะกระจุก อยู่ที่นี่ทั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ผมเคย เสนอไปหลายครั้งแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้กระจายให้ข้าราชการ พนักงานจ้างราย อื่นๆบ้างซึ่งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานจ้างตาม ภารกิจให้เป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกคน ที่เสนอไปก็เพื่อต้องการให้ การดำเนินโครงการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทาง ราชการ เนื่องจากมีการกระจายความรับผิดชอบช่วยกันทำ งานมีการกระจายไม่กระจุก จนทำไมไม่ทันแล้วถูกเร่งรัดกดดันจนต้องดำเนินการด้วยความลุลี้ลุลันทำให้ขาดความ ละเอียดรอบคอบจนเกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ อีกอย่างการแต่งตั้ง คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กระจายความรับผิดชอบไปยังข้าราชการ พนักงานจ้างคนอื่นๆบ้าง จะได้เป็นการช่วยกันกลั่นกรอง เป็นการคานอำนาจในการ ดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใส แต่ทั้งนี้ที่เคยเสนอความเห็นมาแล้วก็ได้ผลแต่ อย่างไม่

การถอดแบบ คำนวณราคา ขอให้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระ มัด ระวางอย่างสูงสุดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถึงแม้กรรมการแต่ละคนจะมี ภาระงานที่ได้รับมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยยึดถือ ประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ
ก่อสร้าง...../

ก่อสร้างใช้สืบลาคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่บางรายการ บางรายการค่าวัสดุเกินร้อยละสิบของราคาทั้งโครงการ การสืบลาคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขานุการช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์) ผมตรวจสอบตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(ปรีชา) เป็นเงิน ๓๙๐,๐๓๘.๒๓ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ โครงการนี้งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้เท่าไร

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์) ๔๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท ครับ ราคากลางที่คำนวณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากตอนทำข้อบัญญัติใช้ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์ฯ เผยแพร่ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยแต่ละรายการของวัสดุ แต่ ณ ตอนคำนวณราคากลางสำนักงานพาณิชย์ฯ ไม่ได้เผยแพร่ราคาวัสดุ ดังนั้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางกำหนดว่า วัสดุใดที่พาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบลาคาวัสดุในท้องที่ โดยใช้ราคาต่ำสุดเมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว เมื่อสืบลาคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้วราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้าข้อบัญญัติสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้งงบประมาณเข้าข้อบัญญัติเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ ๔

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

กรรมการฯ(ปรีชา) ถนนสายนี้ อบต.ได้ทำการซ่อมแซม ตามโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ค่าจ้างตามสัญญา ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มรับประกันความชำรุดบกพร่องตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นการรับประกันความชำรุดบกพร่องวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๑ ปี กรณีเช่นนี้จะทำถนนคอนกรีตซ้ำลงไปได้หรือไม่ เพราะถนนอยู่ในประกันความชำรุด

ประธานฯ ตอนสำรวจจัดทำโครงการซ่อมแซมได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าโครงการมีการเข้าช้อนกันหรือไม่

กรรมการฯ(ปรีชา) ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากถนนชำรุดจากอุทกภัยชาวบ้านเดือดร้อน ผู้บริหารเร่งให้ดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วน และอนุมัติให้ซ่อมไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ประกอบกับความชำรุดเสียหายจากอุทกภัยมีมากหลายสาย และเร่งดำเนินการภายในช่วงเวลา ๙๐ วัน ตามประกาศภัยพิบัติ จึงทำให้ขาดตกบกพร่องไปบ้าง

ประธานฯ กรณีนี้ผมเห็นว่าต้องชะลอโครงการก่อสร้างถนน คสล.ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการประกันความชำรุดบกพร่องของสัญญาซ่อมแซมเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพราะเมื่อเข้าไปทำถนน คสล.ทับลงไปจะให้การประกันความชำรุดบกพร่องเดิมสิ้นผลไป ทำให้ผู้รับจ้างตามสัญญาซ่อมแซมไม่ต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานซ่อมแซมที่ประกันไว้ ผมเห็นว่าน่าจะไม่ต้องและสุมเสี่ยงที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาซ่อมแซม จึงควรชะลอโครงการ ถนน คสล.ไว้ก่อนโดยกันเงินงบประมาณไว้ตามระเบียบฯ ดำเนินการหลังจากการประกันความชำรุดบกพร่องของสัญญาเดิมสิ้นสุดลง

กรรมการฯ(ปรีชา) ผมเห็นด้วยครับ

กรรมการฯ(วิรัชศักดิ์) ผมเห็นด้วยครับ

ประธานฯ สรุปกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรชะลอโครงการ ถนน คสล.ไว้ก่อนโดยกันเงินงบประมาณไว้ตามระเบียบฯ ดำเนินการหลังจากการประกันความชำรุดบกพร่องของสัญญาเดิมสิ้นสุดลง เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการต่อไป

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการฯมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดินสอ - ดอนยูง หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐรัฐพัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง






ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(ปรีชา).....

-ผช.นช.ฯ.....

ภาพประกอบการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมและวิทยาลัยอาชีวศึกษา - ดอนเมือง หมู่ที่ 6
วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 - 15.15 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

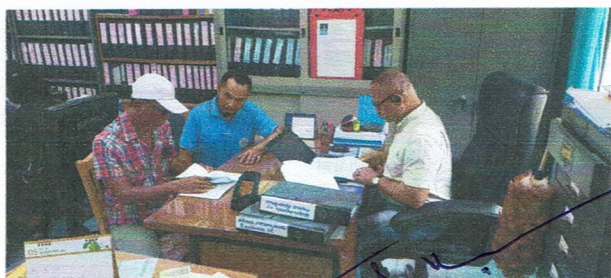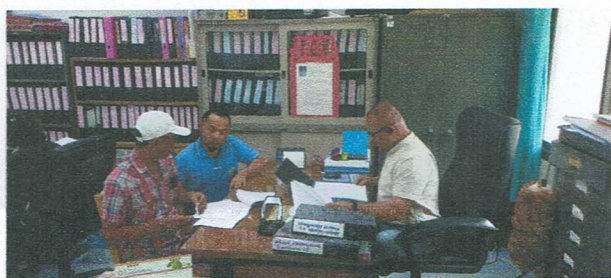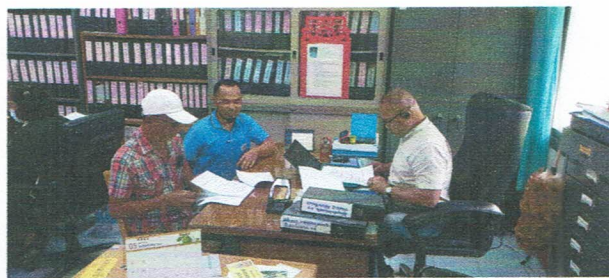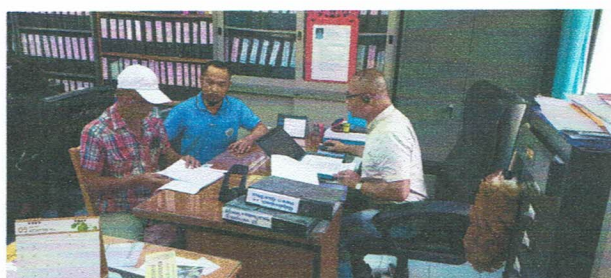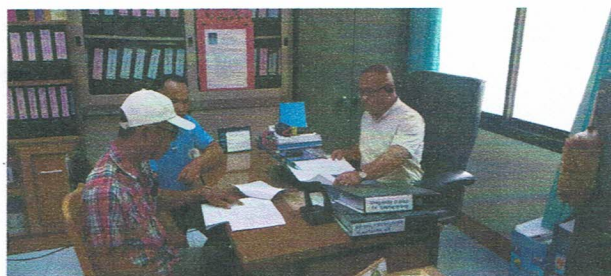

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตงาน(Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. (Reinforced concrete road) สายพยุหิตินสอ - คอนยูง (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบรูปการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการวางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพชนทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m.
- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 135.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.00 cu.m.

- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 sq.m.

รวมปริมาณครุภัณฑ์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 20.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้เหลือที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหลือที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ก.ส.อ. (Reinforced concrete road)สายพุดินสอ - ดอนมุง (4x13.5x0.15 m.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 45/2568 ลว 27 ม.ค. 68) นับวัน 32.00 - 32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดบป)	sq.m.	675.00	1.82	1,228.50	1.4054	2.56	1,726.53	ปรับพื้นที่ทางเดิม
2	งาน soil aggr aggate subbase	cu.m.	135.00	273.00	36,855.00	1.4054	383.67	51,796.02	ถูกรังบรองพื้นที่ทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	27.00	492.17	13,288.59	1.4054	691.70	18,675.78	ทรายรองพื้นที่ทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	540.00	385.77	208,315.80	1.4054	542.16	292,767.03	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	56.00	157.34	8,811.04	1.4054	221.13	12,383.04	หล่อหัวตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	20.25	358.00	7,249.50	1.4054	503.13	10,188.45	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	444.96	1,779.84	1.4054	625.35	2,501.39	หลักเขตทาง อบค.
				277,528.27		total		390,038.23	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				คิดเป็นเงินประมาณ(ตามแผนที่หมั้นเก็บบาทถ้วน)				390,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								277,528.27	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
								/	

ประมาณราคาเป็นค่าประมาณ ให้เกิดความสะดวกเป็นอันจริงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้เพื่อการบริหารงบประมาณ ไม่ใช่ราคากลาง

